




Controle de Versões					
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão		
1.0	10/05/2021	Grupo API	Fase Inicial		

Sumário

OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS	2
OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS GERENCIAMENTO DOS RISCOS PROCESSOS DE RISCOS DOCUMENTOS PADRONIZADOS DE RISCO RESPONSABILIDADES DOS RISCOS DA EQUIPE DO PROJETO IDENTIFICAR OS RISCOS EAR (ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS) RISCOS REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO DOS RISCOS PLANEJAR AS RESPOSTAS AOS RISCOS	2
PROCESSOS DE RISCOS	2
RESPONSABILIDADES DOS RISCOS DA EQUIPE DO PROJETO	2
IDENTIFICAR OS RISCOS	3
EAR (ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS)	3
RISCOS	4
REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS	4
DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO DOS RISCOS	4
REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS	5
PLANEJAR AS RESPOSTAS AOS RISCOS	5
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	5
CONTROLAR OS RISCOS	5



Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

O plano de gerenciamento dos riscos do projeto Aprendizagem por Projeto Integrador como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados.

Gerenciamento dos riscos

Processos de Riscos

Identificar os riscos

Determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características.

Realizar a análise qualitativa dos riscos

Avaliar a exposição ao risco para priorizar os riscos que serão objetos de análise ou ação adicional.

Realizar a análise quantitativa dos riscos

Efetuar a análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

Planejar as respostas aos riscos

Desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

Controlar os riscos

Monitorar e controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto.

Documentos padronizados de risco

Documento	Descrição	Template
Plano de Gerenciamento dos riscos	O Plano de Gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados.	Plano de gerenciamento dos riscos.docx
Registro dos riscos	O registro dos riscos é iniciado no processo Identificar os riscos e é atualizado conforme os outros processos de gerenciamento dos riscos (análise qualitativa, quantitativa, planejar as respostas aos riscos e monitorar e controlar os riscos) são conduzidos, resultando em um aumento no nível e no tipo de informações contidas no registro dos riscos ao longo do tempo.	Registro dos riscos.xlsx

Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

Plano de gerenciamento dos riscos




Aprendizagem por Projeto Integrador - 2021

Membro da Equipe	Responsabilidades
Scrum Master	Transmitir os valores da metodologia ágil, potencializar o
Rodrigo Querino	trabalho da equipe e torná-la independente para realização das
	funções
Product Owner	Ponto de contato entre o time de desenvolvimento e o cliente
Gustavo Robert	
Analista de Dados	Desenvolver e implementar análises de dados, sistemas de
Stephanie Costa	coleta de dados. Utilizar estratégias que otimizam a eficiência e
	a qualidade estatística
Desenvolvedor Back-end	Responsável por manter o funcionamento dos websites.
Pablo Gabriel	Coordena todas as tarefas relacionadas com códigos e
	linguagens de programação
Desenvolvedor Front-end	Responsável por criar a interface de utilização de um site ou
Adriano Aquino	aplicação web.

Identificar os riscos

EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)

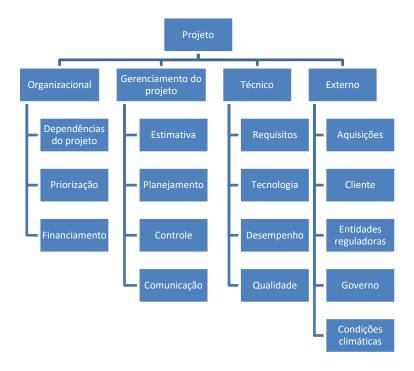



Riscos

- ✓ Número de participantes abaixo do mínimo requerido
- ✓ Falha na comunicação com o cliente
- ✓ Falha na comunicação com o time
- ✓ Indisponibilidade do repositório remoto

Realizar a análise qualitativa dos riscos

Definições de probabilidade e impacto dos riscos

Probabilidade	% de certeza
1-Muito baixa	0 a 20%
2-Baixa	20 a 40%
3-Média	40 a 60%
4-Alta	60 a 80%
5-Muito Alta	> 80%

Impacto
1-Muito baixo
2-Baixo
3-Médio
4-Alto
5-Muito Alto

		Muito baixo (Nota = 1)	Baixo (Nota = 2)	Médio (Nota = 3)	Alto (Nota = 4)	Muito alto (Nota = 5)
Custo		Até 2% no	De 2 a 5% no	De 5 a 8% no orçamento	De 8 a 10% no orçamento	Acima de 10% no
	Custo	orçamento	orçamento			orçamento
	Tempo	Até 2% no	De 2 a 5% no prazo	De 5 a 8% no prazo	De 8 a 10% no prazo	Acima de 10% no
	Tempo	prazo total				prazo
	Escopo		Mudança impactará	Mudança impactará no	Mudança impactará no	
	Escopo		no custo	custo e no tempo	custo, tempo e qualidade	

Probabilidade					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Impacto	1	2	3	4	5

Os graus de riscos serão priorizados da seguinte forma:

Vermelho: risco elevado;Amarelo: risco médio;

• Verde: risco baixo.

Plano de gerenciamento dos riscos	PMO
Aprendizagem por Projeto Integrador – 2021	Project Management Office

Realizar a análise quantitativa dos riscos

A análise de risco quantitativa não será usada por padrão. Caso o Comitê do Projeto decida pelo seu uso pós-análise de riscos qualitativa, será contratada empresa especializada para fazê-lo.

Planejar as respostas aos riscos

Reservas de contingência

Para os riscos não identificados, orçamento e o prazo original serão aumentados em 10%.

O comitê do projeto deverá aprovar o uso das reservas de contingência em reunião que ocorrerá toda primeira segunda-feira de todo mês.

Controlar os riscos

O GP e os responsáveis definidos na matriz de responsabilidade devem acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos, executar os planos de respostas a riscos e avaliar sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto.

O gerente de projeto executa o que foi planejado na análise de riscos e controla os riscos novos identificados durante a execução do projeto.

Este processo consiste de:

- Identificar, analisar, e planejar para riscos novos;
- Monitorar os riscos identificados;
- Analisar novamente os riscos existentes de acordo com as mudanças de contexto;
- Monitorar condições para ativar planos de contingência;
- Monitorar riscos residuais;
- Rever a execução do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficácia;
- Determina se as premissas do projeto ainda são válidas;
- Determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco estão sendo seguidas;
- Determinar se as reservas de contingência de custo e prazo devem ser modificadas com os riscos do projeto.

CheckList

Implementar a análise de risco aprovada.

Identificar novos riscos e gerenciá-los adequadamente.

Atualizar o plano de resposta de riscos com os riscos novos.

Incluir um sumário dos riscos nas reuniões de status.

Revisar todos os documentos impactados.

Conduzir sessões para avaliar os riscos se necessário.

Aprovações						
Participante	Assinatura	Data				
Patrocinador do Projeto						
Gerente do Projeto						
